



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

❖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ❖



คำนำ

ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะเป็นองค์กรที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด และเป็นหน่วยดำเนินการซึ่งทำหน้าที่แทนรัฐในการจัดบริการสาธารณะ การบริหารจัดการภารกิจต่าง ๆ ในพื้นที่รับผิดชอบแก่ประชาชน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนเป็นประการสำคัญ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทอำนาจหน้าที่ในการบริหารจัดการตนเอง และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหลายด้าน เช่น ต้องส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่นด้านสาธารณูปการด้านโครงสร้างพื้นฐาน เป็นต้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลกุยบุรี โดยคณะกรรมการติดตามประเมินผล เจ้าหน้าที่ฝ่ายติดตามและประเมินผล ได้ดำเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลกุยบุรีเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานและการติดตามประเมินผลโครงการให้ที่ประชุมทราบ เพื่อเป็นแนวทางและยึดเป็นหลักในการบริหารให้บริการประชาชน และนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคต เพื่อให้ท้องถิ่นและประชาชนชาวตำบลกุยบุรี มีความเป็นอยู่ที่ดีต่อไปในอนาคตอย่างแท้จริง และขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีมาโดยตลอด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ
สำนักงานปลัดฯ
องค์การบริหารส่วนตำบลกุยบุรี

รายการเงินอุดหนุนระบุนวัตกรรมสังคม/เฉพาะกิจ

ที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

การจัดทำงบประมาณและการใช้งบประมาณ
 องค์การบริหารส่วนตำบลกฤษี ได้ดำเนินโครงการ/กิจกรรม (โครงการพัฒนา) ตามข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.2568

ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ ตามแผน	งบตามแผน	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ /เทศบัญญัติ	लगงม สัญญา	เบงจ่าย	คงเหลือ	วันเริ่มต้น	วันล้นสุด	ร้อยละการ ดำเนิน โครงการ	โอนเพิ่ม	โอนลด	หมายเหตุ
1	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายแยกข้าม คลองชลประทาน ชุมชนตำบลนอก ตำบล หมู่ที่ 5	5,805,000	-	5,805,000		-	22 ก.พ.68	20 ส.ค.68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	-	-
2	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายหัวเขา น้อย-หุบเตย หมู่6	6,350,000.00	-	6,350,000.00		-	18 ก.ย.68	14 ก.พ.69	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	-	-	-
3	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้าง ถนนแอสฟัลติก คอนกรีตเสริม เหล็กสาย	6,775,000.00	-	6,775,000.00		-	18 ก.ย.68	16 มี.ค.69	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	-	-	-

การจัดทำงบประมาณและการใช้งบประมาณ

องค์การบริหารส่วนตำบลกุยบุรี ได้ดำเนินโครงการ/กิจกรรม (โครงการพัฒนา) ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ ตามแผน	งบตามแผน	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ /เทศบาล	ลงนาม สัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	ร้อยละการ ดำเนินงาน โครงการ	โอนเพิ่ม	โอนลด	หมายเหตุ
		ชุกดาเมือง-ต้นตาล ช่วง 1 หมู่ 5											
4	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง สาธารณะ หมู่ 5	6,680,000.00	-	-	-	-	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	-	-	-
5	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้า ร.ร.หนองกระเทียม ซอย 1	151,000.00	-	-	-	-	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	-	-	-

รายการเงินสะสม

ที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

การจัดทำงบประมาณและการใช้งบประมาณ
องค์การบริหารส่วนตำบลยุبری ได้ดำเนินการพัฒนา (โครงการพัฒนา) ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามแผน	งบประมาณตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	รายละเอียดการดำเนินงาน	โอนเพิ่ม	โอนลด	หมายเหตุ
1	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีตสายหน้าวัดหนองตาเสือ หมู่ 5	1,252,800.00	-	-	-	1,252,800.00	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	-
2	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 8 เขตช่วงที่ 2	1,019,000.00	-	-	-	1,019,000.00	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	-
3	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมซอย 9/3 (แยกหลังบ้านผู้ช่วยหมื่น) หมู่ที่ 7	335,000.00	-	315,000.00	-	-	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	-

การจัดทำงบประมาณและการใช้งบประมาณ
 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมบ่อ ได้ดำเนินโครงการ/กิจกรรม (โครงการพัฒนา) ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามแผน	งบประมาณตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	รายละเอียดการดำเนินงาน	โอนเพิ่ม	โอนลด	หมายเหตุ
4	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรุ่งเรือง 2-ทยอีสาน หมู่ที่ 8	550,000.00	-	535,000.00	-	-			อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-	-
5	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอิงอัน หมู่ที่ 3	682,000.00	-	670,000.00	-	-			อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-	-
6	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างสายคลองชลประทาน (ซอยแถมสวีลดี) หมู่ที่ 6	233,000.00	-	214,500.00	-	-			ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-	-

การจัดทำงบประมาณและการใช้งบประมาณ
องค์การบริหารส่วนตำบลกุยบุรี ได้ดำเนินโครงการ/กิจกรรม (โครงการพัฒนา) ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามแผน	งบประมาณตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	รายละเอียดการดำเนินงาน	โอนเพิ่ม	โอนลด	หมายเหตุ
7	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ขอย 8 เขต ช่วงที่ 1 หมู่ที่ 5	448,500.00	-	447,000.00	-	-			อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	-	-	-
8	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีตแยกโรงเรียน-ทางรถไฟ หมู่ที่ 1	380,500.00	-	379,000.00	-	-			อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	-	-	-
9	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการขยายแหล่งทางคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างโรงเรียนบ้านหนองตาเสือ หมู่ 5	74,000.00	-	74,000.00	-	-			อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	-	-	-

การจัดทำงบประมาณและการใช้งบประมาณ

องค์การบริหารส่วนตำบลอุยบุรี ได้ดำเนินโครงการ/กิจกรรม (โครงการพัฒนา) ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามแผน	งบประมาณตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	รายละเอียดการดำเนินงาน	โอนเพิ่ม	โอนลด	หมายเหตุ
10	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายไร่ตอน ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 3	99,100.00	-	91,000.00	-	-	-	-	ดำเนินการยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	-
11	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงคูน้ำสายระบายเก็บขนคลองชลประทาน หมู่ที่ 5	190,000.00	-	185,000.00	-	-	-	-	ดำเนินการยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	-
12	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการวางท่อระบายน้ำ คลส. หมู่ที่ 1 บ้านโรงเกลือ	426,000.00	-	425,000.00	-	-	15 พ.ค .67	21 ต.ค..68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-	-

รายการบัญชีครุภัณฑ์

ที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

การจัดทำงบประมาณและการใช้จ่ายงบประมาณ
องค์การบริหารส่วนตำบลกุยบุรี ได้ดำเนินการ(โครงการพัฒนา)/ครุภัณฑ์ ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2568

ที่	ครุภัณฑ์	พื้นที่ดำเนินการ	ประมาณงาน	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณตามสัญญา (บาท)	การใช้จ่ายงบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
						เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการแล้ว	ดำเนินการอยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ			
1	เครื่องคอมพิวเตอร์แบบประมวลผล	อบต.กุยบุรี	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0	-	√	-	ก.ย.68	กองคลัง	-
2	โน้ตบุ๊ก	อบต.กุยบุรี	จัดซื้อโน้ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0	-	√	-	6 ส.ค.68	สำนักปลัด	-
3	โน้ตบุ๊ก	อบต.กุยบุรี	จัดซื้อโน้ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0	-	√	-	6 ส.ค.68	กองช่าง	-
4	เครื่องปรับอากาศ	อบต.กุยบุรี	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง	###	33,600.00	33,600.00	0	-	√	-	14 มิ.ย.68	สำนักปลัด	-
5	โต๊ะพร้อมเก้าอี้	อบต.กุยบุรี	จัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้สำนักงาน	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0	-	√	-	26 ก.ย.68	สำนักปลัด	-
6	ระบบโสตทัศนศึกษา	อบต.กุยบุรี	ดำเนินการติดตั้งระบบโสตทัศนศึกษา	364,000.00	364,000.00	364,000.00	20,853.00	-	√	-	18 พ.ย.68	กองช่าง	-

องค์การบริหารส่วนตำบลกุยบุรี ได้ดำเนินโครงการ/กิจกรรม(โครงการพัฒนา)/ครุภัณฑ์ ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2568 สามารถจ่ายแนก ดังนี้ (ช่วง 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568) โครงการ/กิจกรรม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	พื้นที่ดำเนินการ	ประมาณงาน	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณตามสัญญา (บาท)	การใช้จ่ายงบประมาณ		ดำเนินการแล้ว	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
						เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	คงเหลือ (บาท)		ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
1	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อที่เขต อบต.กุยบุรี	เพื่อโอนเข้าบัญชี เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	#####	-	#####	223,500.00	√	-	-	-	งบประมาณ 2568	สำนักปลัด	
2	เบี้ยยังชีพความพิการ	เพื่อที่เขต อบต.กุยบุรี	เพื่อโอนเข้าบัญชี เบี้ยยังชีพความพิการ	748,800.00	-	813,800.00	5,000.00	√	-	-	-	งบประมาณ 2568	สำนักปลัด	โอนเพิ่ม 70,000
3	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	เพื่อที่เขต อบต.กุยบุรี	เพื่อโอนเข้าบัญชี เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	60,000.00	-	36,000.00	24,000.00	√	-	-	-	งบประมาณ 2568	สำนักปลัด	-
4	อาหารกลางวัน	โรงเรียนบ้านหนองหมูบ้านหนองกระทิง	เพื่อโอนเงินเป็นค่าอาหารกลางวัน	696,600.00	-	715,500.00	1,100.00	√	-	-	-	งบประมาณ 2568	สำนักปลัด	โอนเพิ่ม 20,000
5	อาหารเสริม(นม)	โรงเรียนบ้านหนองหมูบ้านหนองกระทิง	เพื่อโอนเงินเป็นค่าอาหารเสริม(นม)	272,680.00	-	293,959.38	1,720.62	√	-	-	-	งบประมาณ 2568	สำนักปลัด	โอนเพิ่ม 23,000

องค์การบริหารส่วนตำบลกฤษบุรี ได้ดำเนินโครงการ/กิจกรรม(โครงการพัฒนา)/ครุภัณฑ์ ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2568

สามารถจำแนก ดังนี้ (ช่วง 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568) โครงการ/กิจกรรม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	พื้นที่ดำเนินการ	ประมาณงาน	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณตามสัญญา (บาท)	การใช้จ่ายงบประมาณ	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
								ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
								ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	การ			
6	โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน	โรงเรียนบ้านบ้านหนองกระเทียม	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนา ศักยภาพเด็กและเยาวชน	30,000.00	-	28,190.00	1,810.00	√	-	-	งบประมาณ สำนักปลัด 2568	-	
7	โครงการควบคุมและป้องกันพิษสุนัขบ้า	เขตพื้นที่ อบต.กฤษบุรี	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันพิษสุนัขบ้า	30,000.00	-	11,040.00	18,960.00	√	-	-	งบประมาณ สำนักปลัด 2568	-	
8	โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย	อบต.กฤษบุรี	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย	20,000.00	-	12,240.00	2,100.00	√	-	-	งบประมาณ สำนักปลัด 2568	-	
9	โครงการสาธารณสุขในพระราชดำริน	เขตพื้นที่ อบต.กฤษบุรี	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการสาธารณสุขในพระราชดำริน	140,000.00	-	100,000.00	40,000.00	√	-	-	งบประมาณ สำนักปลัด 2568	-	
10	โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ	เขตอำเภอ กฤษบุรี	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ	20,000.00	-	6,000.00	14,000.00	√	-	-	งบประมาณ สำนักปลัด 2568	-	
11	โครงการป้องกันและแก้ไขภัยพิบัติ (To be number one)	โรงเรียนบ้านหนองกระเทียม	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการป้องกันและแก้ไขภัยพิบัติ (To be number one)	20,000.00	-	9,390.00	10,610.00	√	-	-	งบประมาณ สำนักปลัด 2568	-	

องค์การบริหารส่วนตำบลกุยบุรี ได้ดำเนินโครงการ/กิจกรรม(โครงการพัฒนา)/ครุภัณฑ์ ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2568 สามารถจำแนก ดังนี้ (ช่วง 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568) โครงการ/กิจกรรม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	พื้นที่ดำเนินการ	ปริมาณงาน	งบประมาณที่จัดไว้ (บาท)	งบประมาณตามสัญญา (บาท)	การใช้จ่ายงบประมาณ		ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
						เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
12	โครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาอาชีพ	อบต.กุยบุรี	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาอาชีพ	20,000.00	-	19,100.00	900	√	-	-	-	งบประมาณสำนักปลัด 2568	-	-
13	โครงการงานประเพณีลอยกระทง	วัดกุยบุรี	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการงานประเพณีลอยกระทง	20,000.00	20,000.00	-	-	√	-	-	-	งบประมาณสำนักปลัด 2568	-	-
14	โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา	วัดหนองตาเสือ	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา	10,000.00	10,000.00	-	-	√	-	-	-	งบประมาณสำนักปลัด 2568	-	-
15	โครงการประเพณีแห่เครื่องสักการะหลวงพ่อบุญ	วัดกุยบุรี	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการแห่เครื่องสักการะหลวงพ่อบุญ	35,000.00	24,000.00	-	-	√	-	-	-	งบประมาณสำนักปลัด 2568	-	โอนลด 11,000

โครงการที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๘

เงินงบประมาณ

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๑	โครงการขุดลอกรางระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ ๕ บ้านหนองตาเสือ	๑,๐๓๑,๐๐๐

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๒	โครงการก่อสร้างแอสฟัลต์ติกคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกข้ามคลองชลประทาน-ชนเขตบ่อนอก-ต้นตาล หมู่ที่ ๕ บ้านหนองตาเสือ	๕,๘๐๕,๐๐๐

จ่ายขาดเงินสะสม

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๓	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ ๑ บ้านโรงกุลี	๔๒๕,๐๐๐
๔	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายไร่ตอน ช่วงที่ ๒ หมู่ที่ ๓ บ้านหนองมะฆาง	๙๑,๐๐๐

เงินอุดหนุนไฟฟ้า

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้า ร.ร หนองกระทิง ซอย ๑ หมู่ที่ ๖ บ้านหนองกระทิง	๑๕๑,๐๐๐

งบกลาง

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๖	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.สายสระยายเก็บชนคลองชลประทาน หมู่ที่ ๕ บ้านหนองตาเสือ	๕๐,๐๐๐


รวมทั้งสิ้น ๗,๕๕๓,๐๐๐ บาท


โครงการที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๘

เงินงบประมาณ

- ๑.โครงการขุดลอกรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่๕ บ้านหนองตาเสือ



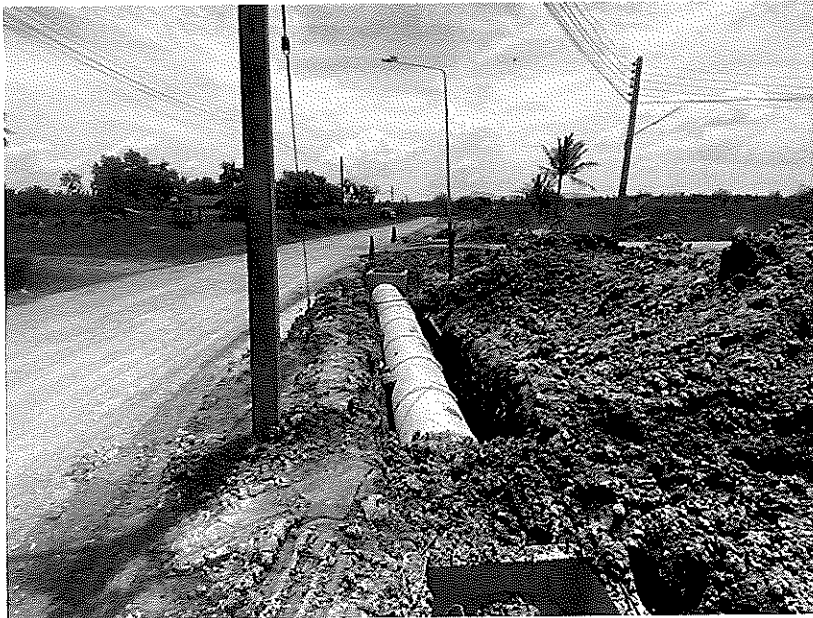

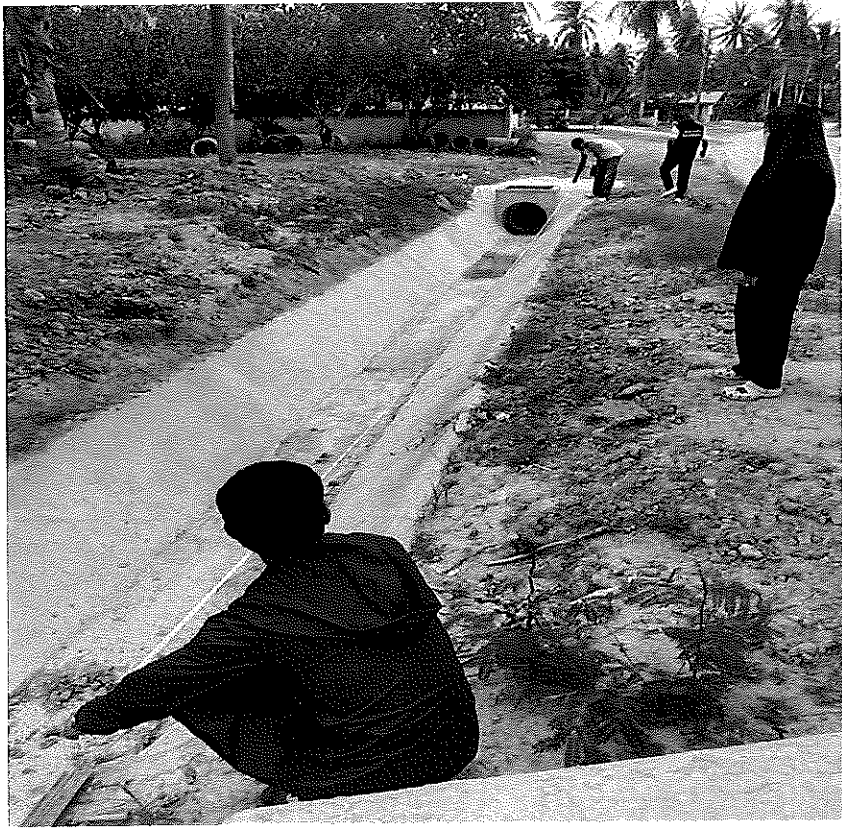

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกข้ามคลองชลประทาน-ชนเขตปอนอก-ต้นตาล

หมู่ที่ ๕ บ้านหนองตาเสือ







จ่ายขาดเงินสะสม

๓.โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ ๑ บ้านโรงกุลี








๔.โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายไร่ตอน ช่วงที่ ๒ หมู่ที่ ๓ บ้านหนองมะฆาง





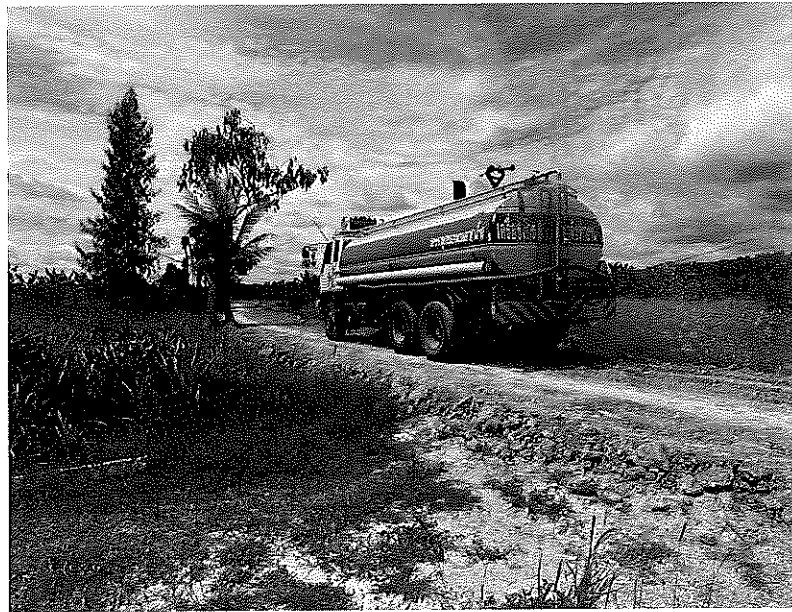



เงินอุดหนุนไฟฟ้า

๕.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้า ร.ร. หนองกระทิง ซอย ๑ หมู่ที่ ๖ บ้านหนอง
กระทิง







งบทกลาง

๖.โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.สายระยะยาวเก็บขนคลองชลประทาน หมู่ที่ ๕ บ้านหนองตาเสือ













รายการโครงการ / กิจกรรม





ที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

โครงการควบคุมและป้องกันพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๘

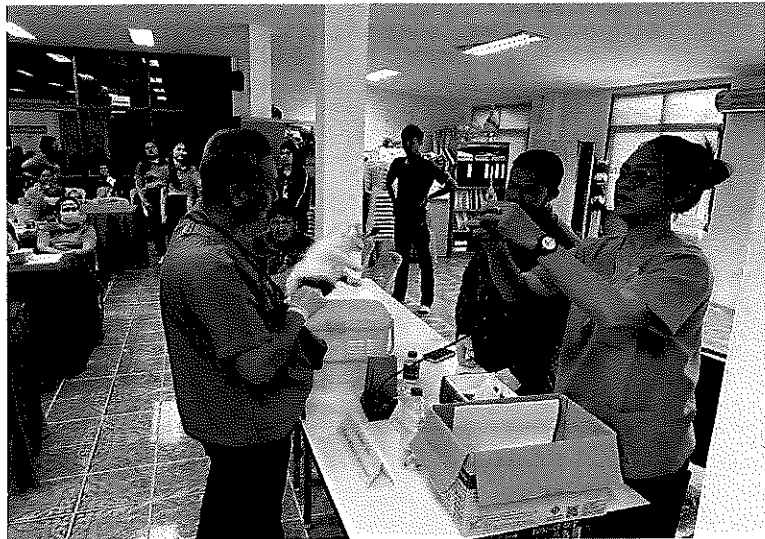


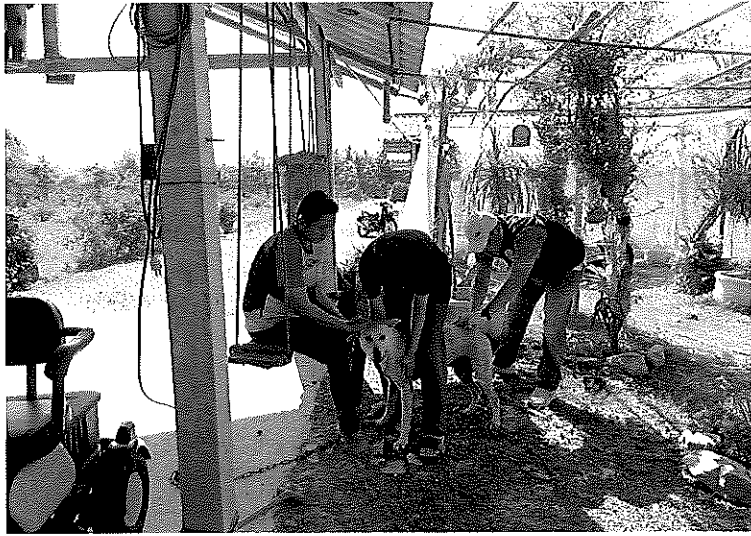


โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน ประจำปี ๒๕๖๘

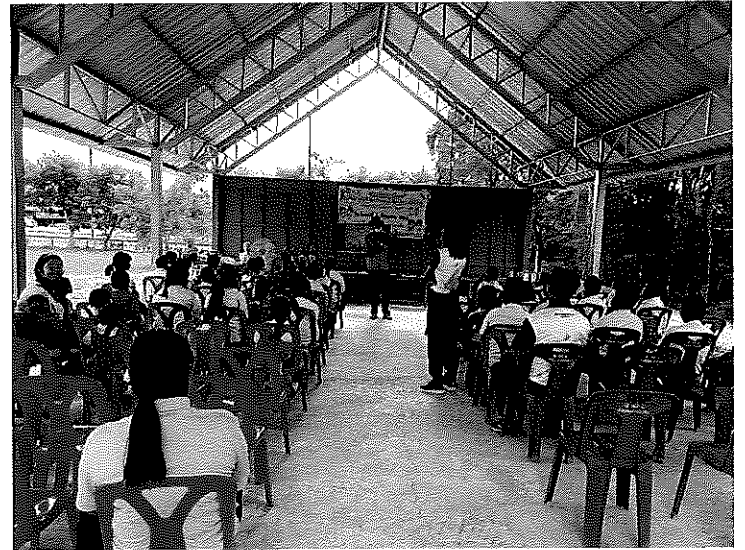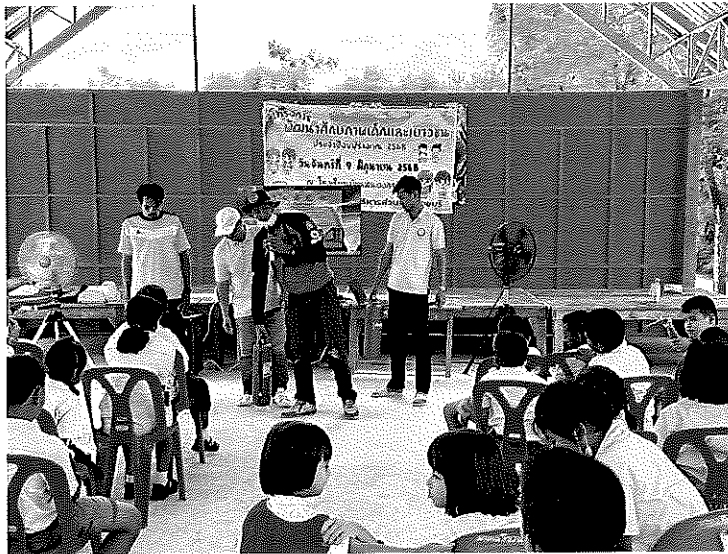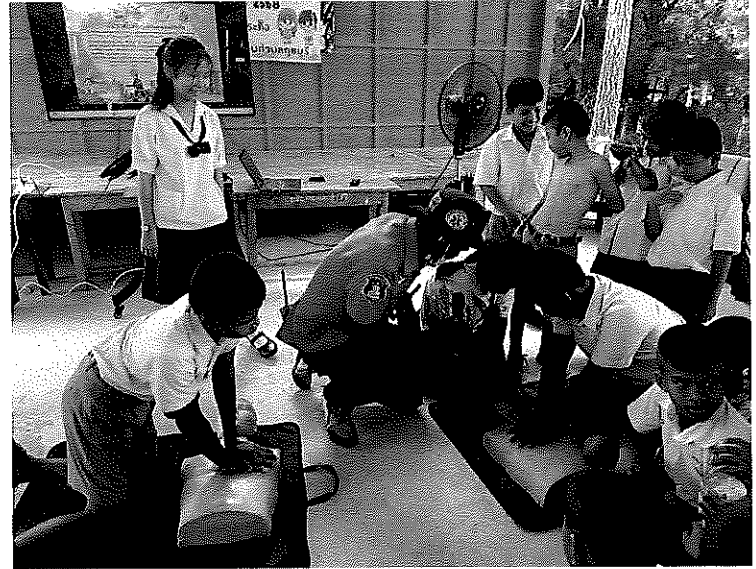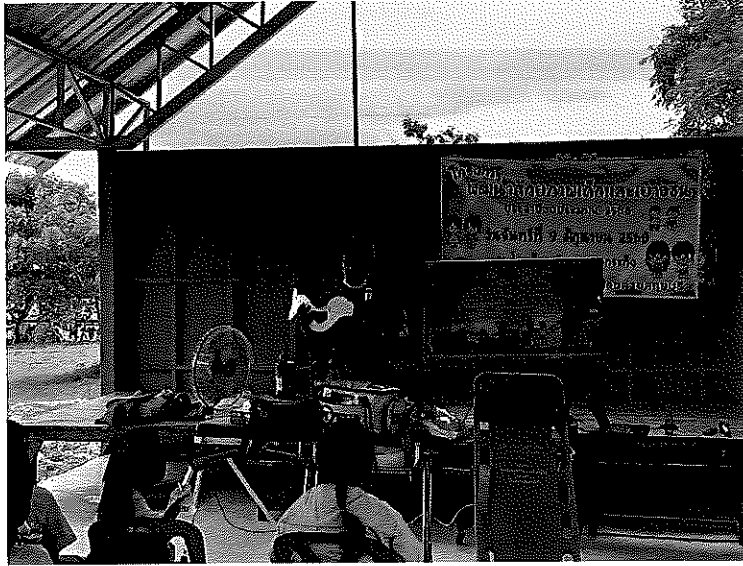




โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ประจำปี ๒๕๖๘

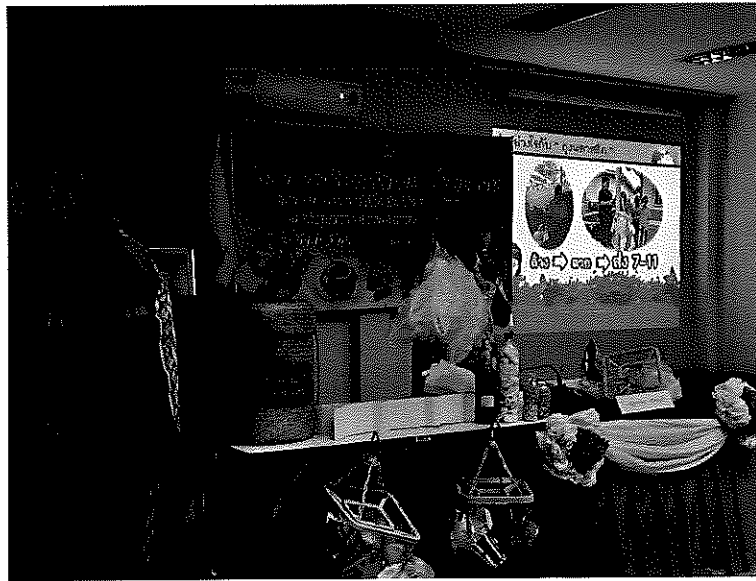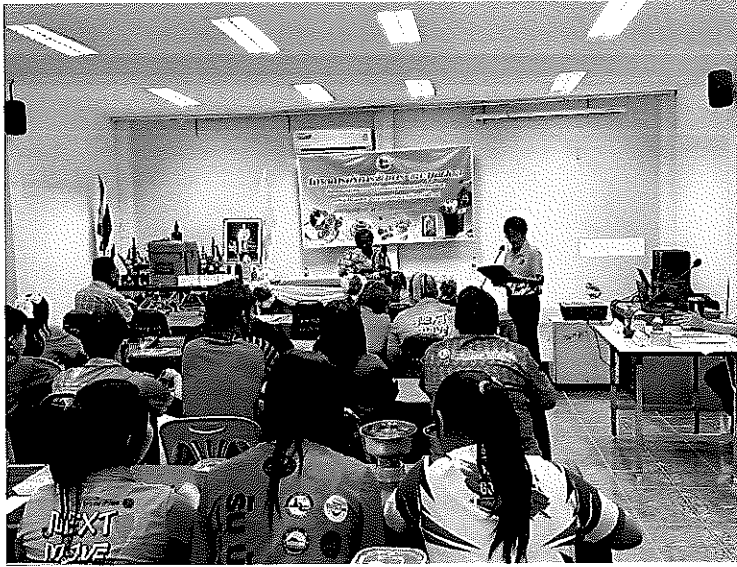

โครงการจิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ ประจำปี ๒๕๖๘






โครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาอาชีพ
ประจำปีงบประมาณ 2568

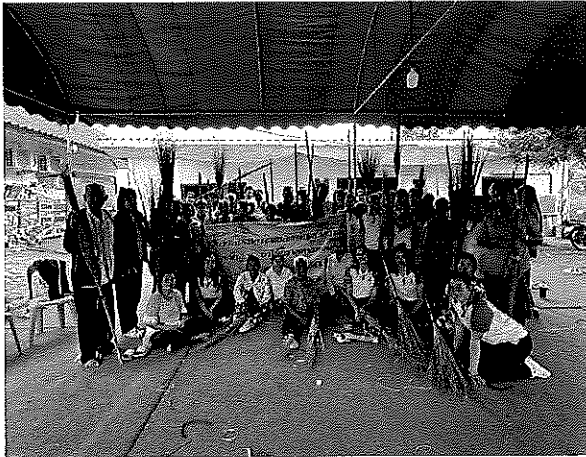

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด


ประจำปีงบประมาณ 2568

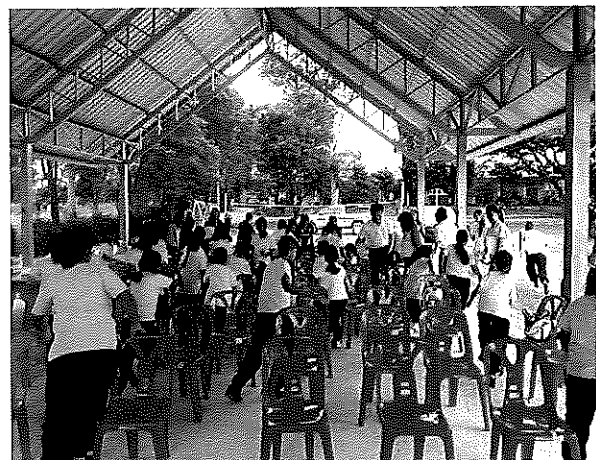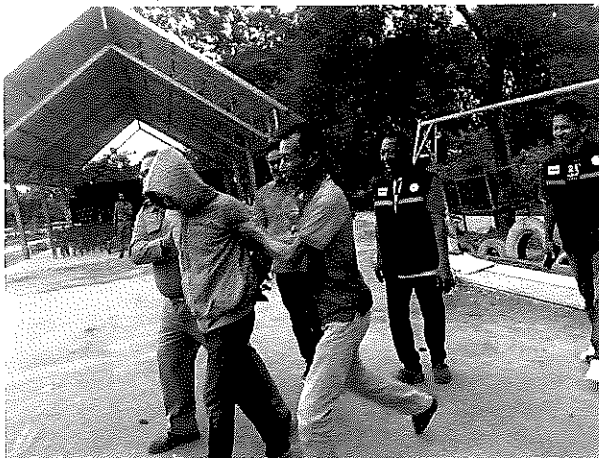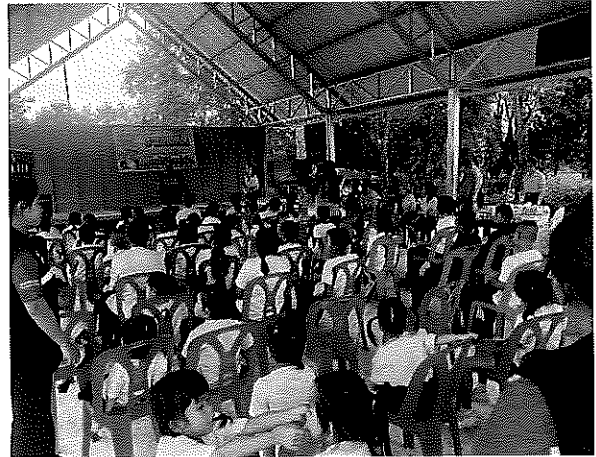

โครงการงานประเพณีลอยกระทง
ประจำปีงบประมาณ 2568




โครงการงานประเพณีแห่เครื่องสักการะหลวงพ่อในกุฏิ
ประจำปีงบประมาณ 2568

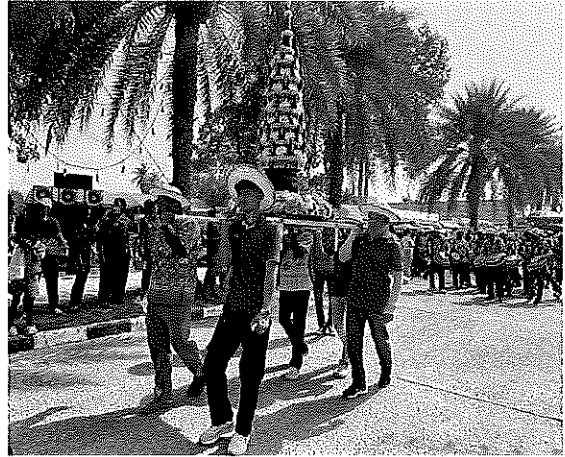

โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา

ประจำปีงบประมาณ 2568

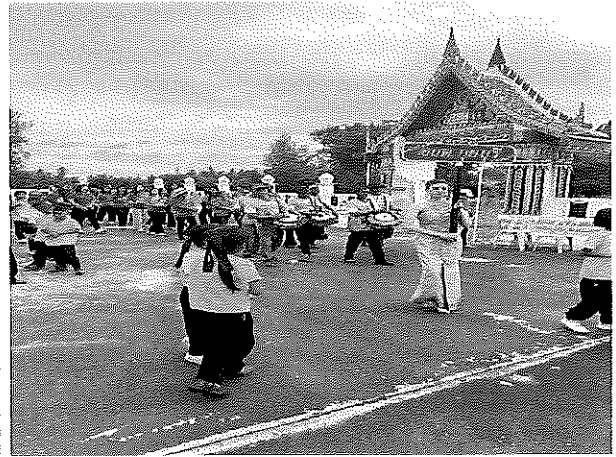



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุยบุรี
เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- (๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
- (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
- (๓) กำหนดให้รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบภายในสัปดาห์วัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสัปดาห์ โดยอย่างน้อยปิดปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลกุยบุรี ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายงานติดตามและประเมินผลแผนฯ ดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายวินัย ไหล่)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุยบุรี
