




# รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

❖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ❖



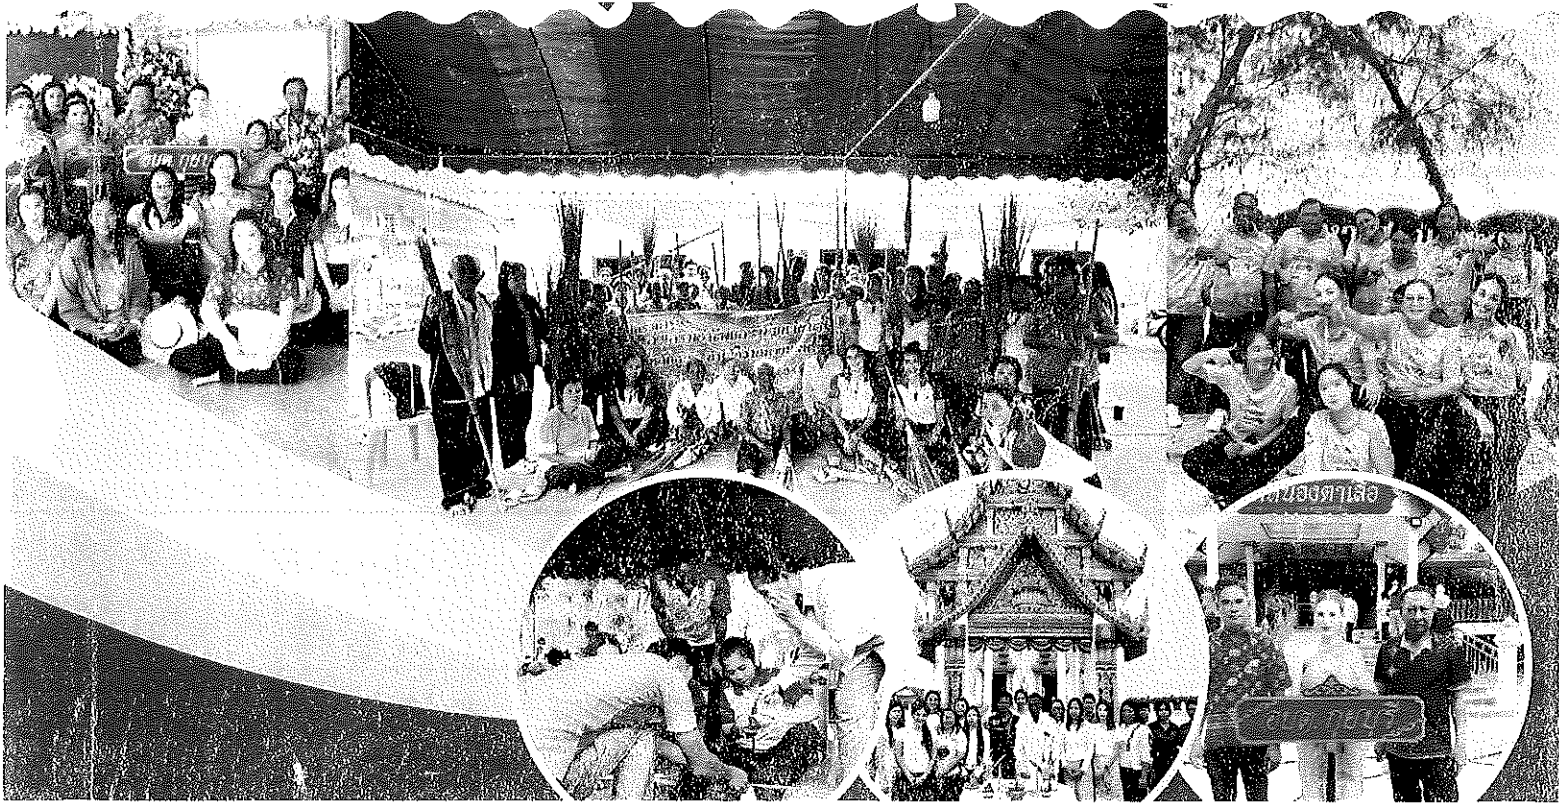

# รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

❖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ❖



## คำนำ

ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะเป็นองค์กรที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด และเป็นหน่วยดำเนินการซึ่งทำหน้าที่แทนรัฐในการจัดบริการสาธารณะ การบริหารจัดการภารกิจต่าง ๆ ในพื้นที่รับผิดชอบแก่ประชาชน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนเป็นประการสำคัญ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทอำนาจหน้าที่ในการบริหารจัดการตนเอง และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหลายด้าน เช่น ต้องส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่นด้านสาธารณูปการด้านโครงสร้างพื้นฐาน เป็นต้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลกุยบุรี โดยคณะกรรมการติดตามประเมินผล เจ้าหน้าที่ฝ่ายติดตามและประเมินผล ได้ดำเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลกุยบุรีเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานและการติดตามประเมินผลโครงการให้ที่ประชุมทราบ เพื่อเป็นแนวทางและยึดเป็นหลักในการบริหารให้บริการประชาชน และนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคต เพื่อให้ท้องถิ่นและประชาชนชาวตำบลกุยบุรี มีความเป็นอยู่ที่ดีต่อไปในอนาคตอย่างแท้จริง และขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีมาโดยตลอด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ  
สำนักงานปลัดฯ  
องค์การบริหารส่วนตำบลกุยบุรี

รายการเงินอุดหนุนระดับจังหวัด/เฉพาะกิจ

ที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

การจัดทำงบประมาณและการใช้งบประมาณ  
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมพူ ได้ดำเนินโครงการ/กิจกรรม (โครงการพัฒนา) ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามแผน	งบประมาณตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	ร้อยละการดำเนินงาน	โอนเพิ่ม	โอนลด	หมายเหตุ
1	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกข้ามคลองชลประทาน ขณะตบออก ตำบล หมู่ที่ 5	5,805,000	-	5,805,000		-	22 ก.พ.68	20 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-	-
2	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหัวเขา น้อย-หุบเตย หมู่6	6,350,000.00	-	6,350,000.00		-	18 ก.ย.68	14 ก.พ.69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	-
3	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนเอสพีลัดติก คอนกรีตเสริมเหล็กสาย	6,775,000.00	-	6,775,000.00		-	18 ก.ย.68	16 มี.ค.69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	-

การจัดทำงบประมาณและการใช้งบประมาณ

องค์การบริหารส่วนตำบลภูขี้เฒ่า ได้ดำเนินโครงการ/กิจกรรม (โครงการพัฒนา) ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามแผน	งบประมาณตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	รายละเอียดการดำเนินงาน	โอนเพิ่ม	โอนลด	หมายเหตุ
		ชุกตาเมือง-ต้นตาล ช่วง 1 หมู่ 5											
4	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ หมู่ 5	6,680,000.00	-	-	-	-	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	-
5	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้า ร.ว.หนองกระทิง ซอย 1	151,000.00	-	-	-	-	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	-

# รายการเงินสะสม

ที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

การจัดทำงบประมาณและการใช้งบประมาณ  
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมพภูมิ ได้ดำเนินโครงการ/กิจกรรม (โครงการพัฒนา) ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ ตามแผน	งบตามแผน	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ /เทศบัญญัติ	ลงนาม สัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	ร้อยละการ ดำเนิน โครงการ	โอนเพิ่ม	โอนลด	หมายเหตุ
1	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีตสายหน้าวัดหนองตาเสือ หมู่ 5	1,252,800.00	-	-	-	1,252,800.00	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	-
2	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยาย 8 เมตร ช่วงที่ 2	1,019,000.00	-	-	-	1,019,000.00	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	-
3	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมขอย 9/3 (แยกหลังบ้านผู้ช่วยหมื่น) หมู่ที่ 7	335,000.00	-	315,000.00	-	-	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	-

การจัดทำงบประมาณและการใช้งบประมาณ  
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมพူ ได้ดำเนินโครงการ/กิจกรรม (โครงการพัฒนา) ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามแผน	งบประมาณตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	รายละเอียดการดำเนินงาน	โอนเพิ่ม	โอนลด	หมายเหตุ
4	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรุ่งเรือง 2-ไทยอีสาน หมู่ที่ 8	550,000.00	-	535,000.00	-	-			อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-	
5	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอิงอัน หมู่ที่ 3	682,000.00	-	670,000.00	-	-			อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-	
6	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังหินคลุกสายคลองขลประทาน (ซอยแยมสวีสต์) หมู่ที่ 6	233,000.00	-	214,500.00	-	-			ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-	

การจัดทำงบประมาณและการใช้งบประมาณ  
 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมบ่อ ได้ดำเนินการ/กิจกรรม (โครงการพัฒนา) ตามข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.2568

ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามแผน	งบประมาณตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	รายละเอียดการดำเนินงานโครงการ	โอนเพิ่ม	โอนลด	หมายเหตุ
7	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ซอย 8 เขต ช่วงที่ 1 หมู่ที่ 5	448,500.00	-	447,000.00	-	-			อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-	-
8	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีตแยกโรงเรียน-ทางรถไฟ หมู่ที่ 1	380,500.00	-	379,000.00	-	-			อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-	-
9	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการขยายแหล่งทางคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างโรงเรียนบ้านหนองตาเสือ หมู่ 5	74,000.00	-	74,000.00	-	-			อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-	-

การจัดทำงบประมาณและการใช้งบประมาณ

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมบ่อ ได้ดำเนินโครงการ/กิจกรรม (โครงการพัฒนา) ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามแผน	งบประมาณตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	ร้อยละการดำเนินงานโครงการ	โอนเพิ่ม	โอนลด	หมายเหตุ
10	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายไรดอน ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 3	99,100.00	-	91,000.00	-	-	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	-
11	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงลูกรังสายสร้อยเก็บขนคลองชลประทาน หมู่ที่ 5	190,000.00	-	185,000.00	-	-	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	-
12	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการวางท่อระบายน้ำ คล. หมู่ที่ 1 บ้านโรงเกลือ	426,000.00	-	425,000.00	-	-	15 พ.ค .67	21 ต.ค..68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-	-

# รายการบัญชีครุภัณฑ์

ที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

การจัดทำงบประมาณและการใช้จ่ายงบประมาณ  
องค์การบริหารส่วนตำบลกุกบุรี ได้ดำเนินการ/กิจกรรม(โครงการพัฒนา)/ครุภัณฑ์ ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2568

ที่	ครุภัณฑ์	พื้นที่ดำเนินการ	ประมาณงาน	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณตามสัญญา (บาท)	การใช้จ่ายงบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ	
						เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการแล้ว	ดำเนินการอยู่ระหว่าง	ยังไม่ดำเนินการ				ไม่ได้ดำเนินการ
1	เครื่องคอมพิวเตอร์แบบประมวลผล	อบต.กุกบุรี	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0	-	✓	-	-	ก.ย.68	กองคลัง	-
2	โน้ตบุ๊ก	อบต.กุกบุรี	จัดซื้อโน้ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0	-	✓	-	-	6 ส.ค.68	สำนักปลัด	-
3	โน้ตบุ๊ก	อบต.กุกบุรี	จัดซื้อโน้ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0	-	✓	-	-	6 ส.ค.68	กองช่าง	-
4	เครื่องปรับอากาศ	อบต.กุกบุรี	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง	#####	33,600.00	33,600.00	0	-	✓	-	-	14 มิ.ย.68	สำนักปลัด	-
5	โต๊ะพร้อมเก้าอี้	อบต.กุกบุรี	จัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้สำนักงาน	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0	-	✓	-	-	26 ก.ย.68	สำนักปลัด	-
6	ระบบโสตทัศนศึกษาสำนักงาน	อบต.กุกบุรี	ดำเนินการติดตั้งระบบโสตทัศนศึกษาสำนักงาน	364,000.00	364,000.00	364,000.00	20,853.00	-	✓	-	-	18 พ.ย.68	กองช่าง	-

องค์การบริหารส่วนตำบลกุยบุรี ได้ดำเนินโครงการ/กิจกรรม(โครงการพัฒนา)/ครุภัณฑ์ ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2568  
 สามารถจำแนก ดังนี้ ( ช่วง 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568 ) โครงการ/กิจกรรม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	พื้นที่ดำเนินการ	ประมาณงาน	งบประมาณ ที่จัดไว้ (บาท)	งบประมาณ ตามสัญญา (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ	
						เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ				ยังไม่ ได้
1	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อที่เขต อบต.กุยบุรี	เพื่อโอนเข้าบัญชี เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	#####	-	#####	223,500.00	√	-	-	งบประมาณ 2568	สำนักปลัด	
2	เบี้ยยังชีพความพิการ	เพื่อที่เขต อบต.กุยบุรี	เพื่อโอนเข้าบัญชี เบี้ยยังชีพความ พิการ	748,800.00	-	813,800.00	5,000.00	√	-	-	งบประมาณ 2568	สำนักปลัด	โอนเพิ่ม 70,000
3	เบี้ยยังชีพผู้วัยเอดส์	เพื่อที่เขต อบต.กุยบุรี	เพื่อโอนเข้าบัญชี เบี้ยยังชีพผู้วัย เอดส์	60,000.00	-	36,000.00	24,000.00	√	-	-	งบประมาณ 2568	สำนักปลัด	-
4	อาหารกลางวัน	โรงเรียนบ้านหนอง หมู,บ้านหนอง กระพัง	เพื่อโอนเงินเป็นค่า อาหารกลางวัน	696,600.00	-	715,500.00	1,100.00	√	-	-	งบประมาณ 2568	สำนักปลัด	โอนเพิ่ม 20,000
5	อาหารเสริม(นม)	โรงเรียนบ้านหนอง หมู,บ้านหนอง กระพัง	เพื่อโอนเงินเป็นค่า อาหารเสริม(นม)	272,680.00	-	293,959.38	1,720.62	√	-	-	งบประมาณ 2568	สำนักปลัด	โอนเพิ่ม 23,000

องค์การบริหารส่วนตำบลกุยบุรี ได้ดำเนินโครงการ/กิจกรรม(โครงการพัฒนา)/ครุภัณฑ์ ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2568 สามารถจำแนก ดังนี้ ( ช่วง 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568 ) โครงการ/กิจกรรม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	พื้นที่ดำเนินการ	ปริมาณงาน	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ตามสัญญา (บาท)	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	คงเหลือ (บาท)				
6	โครงการพัฒนา ศักยภาพเด็กและ เยาวชน	โรงเรียนบ้าน บ้านหนองกระเทียม	เพื่อเป็นจ่ายค่า โครงการพัฒนา ศักยภาพเด็กและ เยาวชน	30,000.00	-	28,190.00	1,810.00	ดำเนินการ แล้ว	งบประมาณ 2568	สำนักปลัด	-
7	โครงการควบคุมและ ป้องกันพิษสุนัขบ้า	เขตพื้นที่ อบต.กุยบุรี	เพื่อเป็นค่าโครงการ ป้องกันพิษสุนัข บ้า	30,000.00	-	11,040.00	18,960.00	ดำเนินการ แล้ว	งบประมาณ 2568	สำนักปลัด	-
8	โครงการบริหาร จัดการขยะมูลฝอย	อบต.กุยบุรี	เพื่อจ่ายเป็นค่า โครงการบริหาร จัดการขยะมูลฝอย	20,000.00	-	12,240.00	2,100.00	ดำเนินการ แล้ว	งบประมาณ 2568	สำนักปลัด	-
9	โครงการสาธารณสุข ในพระราชดำริ	เขตพื้นที่ อบต.กุยบุรี	เพื่อจ่ายเป็นค่า โครงการสาธารณสุข ในพระราชดำริ	140,000.00	-	100,000.00	40,000.00	ดำเนินการ แล้ว	งบประมาณ 2568	สำนักปลัด	-
10	โครงการจิตอาสาเรา ทำดีด้วยหัวใจ	เขตอำเภอกุยบุรี	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการ จิตอาสาเรา ทำดีด้วยหัวใจ	20,000.00	-	6,000.00	14,000.00	ดำเนินการ แล้ว	งบประมาณ 2568	สำนักปลัด	-
11	โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด (To be number one)	โรงเรียนบ้าน หนองกระเทียม	เพื่อจ่ายเป็นค่า โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด (To be number one)	20,000.00	-	9,390.00	10,610.00	ดำเนินการ แล้ว	งบประมาณ 2568	สำนักปลัด	-

องค์การบริหารส่วนตำบลกุยบุรี ได้ดำเนินโครงการ/กิจกรรม(โครงการพัฒนา)/ครุภัณฑ์ ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2568 สามารถจำแนกตามโครงการ/กิจกรรม ( ช่วง 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568 ) โครงการ/กิจกรรม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	พื้นที่ดำเนินการ	ประมาณงาน	งบประมาณ		การใช้จ่ายงบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ที่จัดไว้ (บาท)	ตามสัญญา (บาท)	เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้ดำเนินการ			
12	โครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาอาชีพ	อบต.กุยบุรี	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาอาชีพ	20,000.00	-	19,100.00	900	√	-	-	งบประมาณ 2568	สำนักปลัด	-
13	โครงการงานประเพณีลอยกระทง	วัดกุยบุรี	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการงานประเพณีลอยกระทง	20,000.00	20,000.00	-	-	√	-	-	งบประมาณ 2568	สำนักปลัด	-
14	โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา	วัดหนองตาเสือ	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา	10,000.00	10,000.00	-	-	√	-	-	งบประมาณ 2568	สำนักปลัด	-
15	โครงการประเพณีแห่เครื่องสักการะหลวงพ่อบุญ	วัดกุยบุรี	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการแห่เครื่องสักการะหลวงพ่อบุญ	35,000.00	24,000.00	-	-	√	-	-	งบประมาณ 2568	สำนักปลัด	โอนลด 11,000

โครงการที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๘

เงินงบประมาณ

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๑	โครงการขุดลอกรางระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ ๕ บ้านหนองตาเสือ	๑,๐๓๑,๐๐๐

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๒	โครงการก่อสร้างแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกข้ามคลอง ชลประทาน-ชนเขตบ่อนอก-ต้นตาล หมู่ที่ ๕ บ้านหนองตาเสือ	๕,๘๐๕,๐๐๐

จ่ายขาดเงินสะสม

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๓	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ ๑ บ้านโรงคูลี	๔๒๕,๐๐๐
๔	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายไร้ตอน ช่วงที่ ๒ หมู่ที่ ๓ บ้านหนองมะฆาง	๙๑,๐๐๐

เงินอุดหนุนไฟฟ้า

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้า ร.ร หนองกระทิง ซอย ๑ หมู่ที่ ๖ บ้านหนองกระทิง	๑๕๑,๐๐๐

งบกลาง

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๖	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.สายสระยายเก็บชนคลองชลประทาน หมู่ที่ ๕ บ้านหนองตาเสือ	๕๐,๐๐๐


รวมทั้งสิ้น ๗,๕๕๓,๐๐๐ บาท


# โครงการที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๘

## เงินงบประมาณ

- ๑.โครงการขุดลอกทางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่๕ บ้านหนองตาเสือ



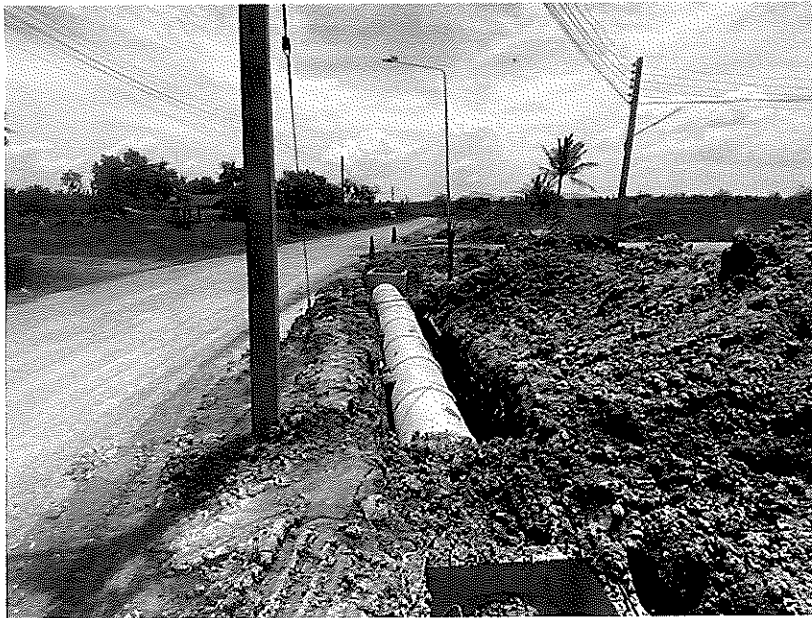

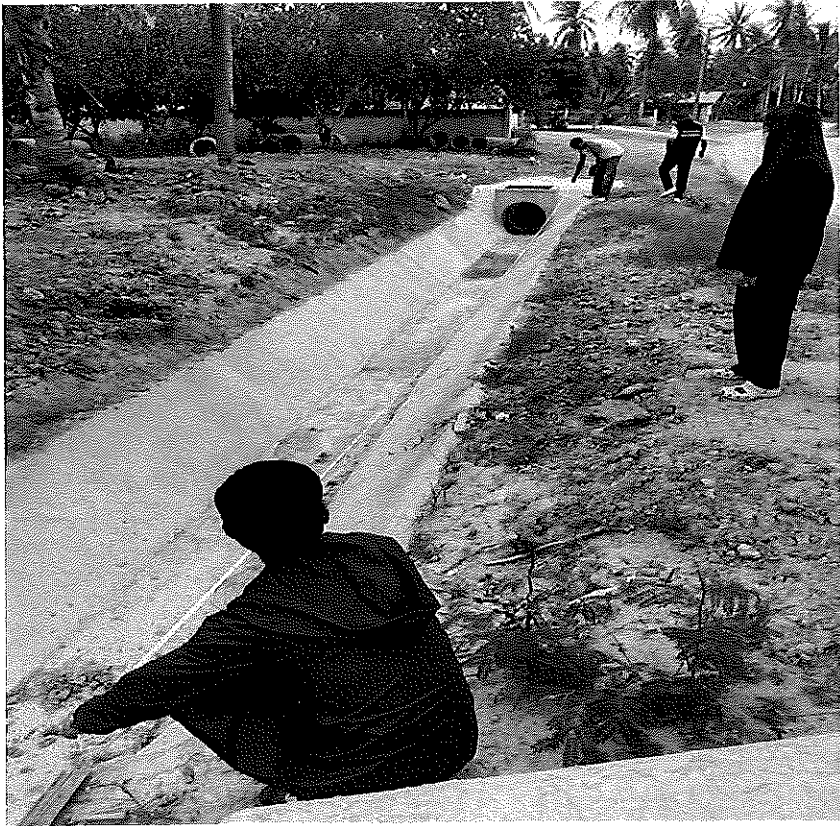

## เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกข้ามคลองชลประทาน-ชนเขตป่อนอก-ตันตล  
หมู่ที่ ๕ บ้านหนองตาเสือ







## จ่ายขาดเงินสะสม

๓.โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ ๑ บ้านโรงกุลี







๔.โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายไร่ดอน ช่วงที่ ๒ หมู่ที่ ๓ บ้านหนองมะฆาง









เงินอุดหนุนไฟฟ้า

๕.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้า ร.ร. หนองกระทิง ซอย ๑ หมู่ที่ ๖ บ้านหนอง  
กระทิง







## งบลาง

๖.โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.สายระยะยาวเก็บขนคลองชลประทาน หมู่ที่ ๕ บ้านหนองตาเสือ















# รายการโครงการ / กิจกรรม


ที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

# โครงการควบคุมและป้องกันพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๘

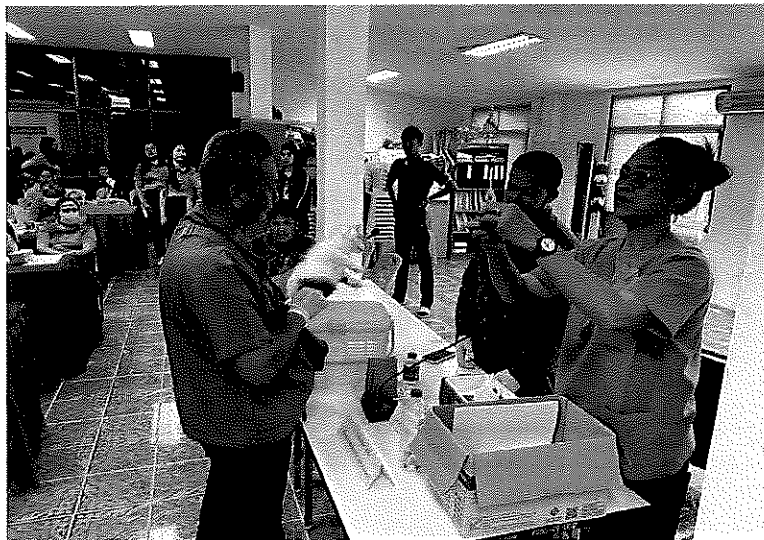


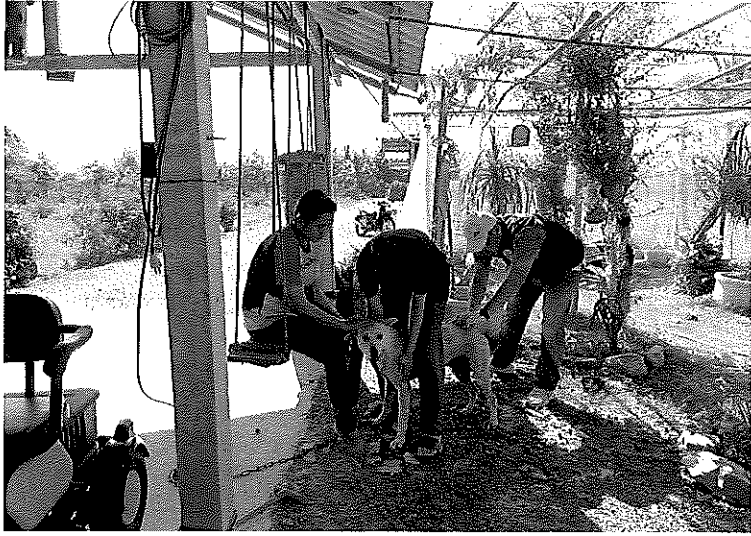


โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน ประจำปี ๒๕๖๘

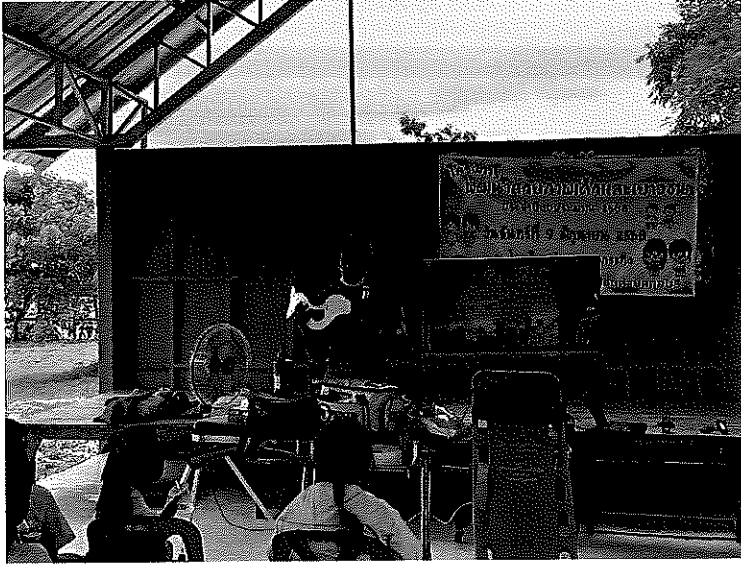




# โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ประจำปี ๒๕๖๘

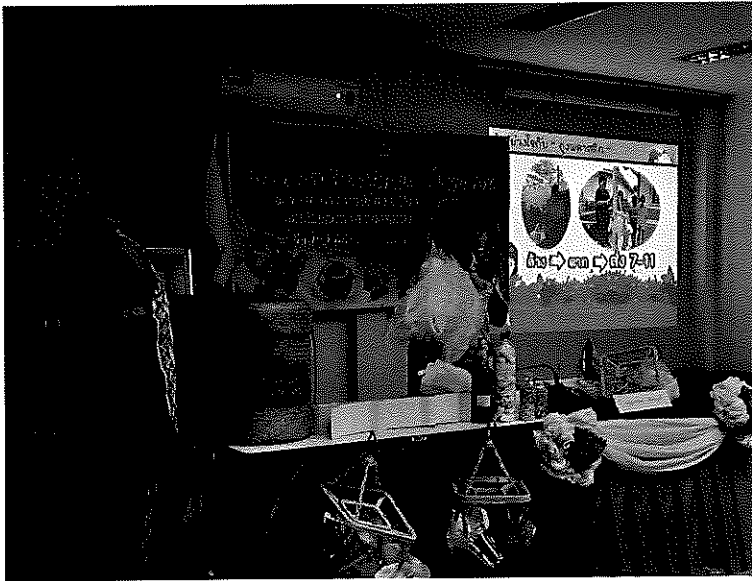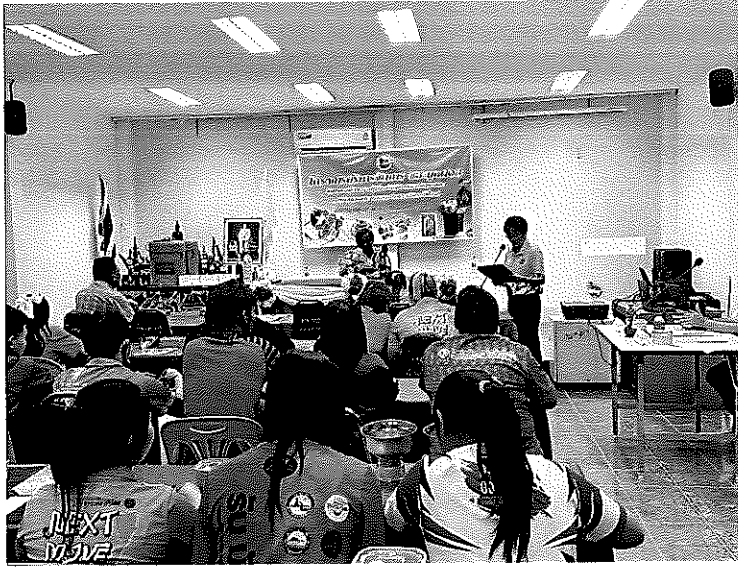




โครงการจิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ ประจำปี ๒๕๖๘

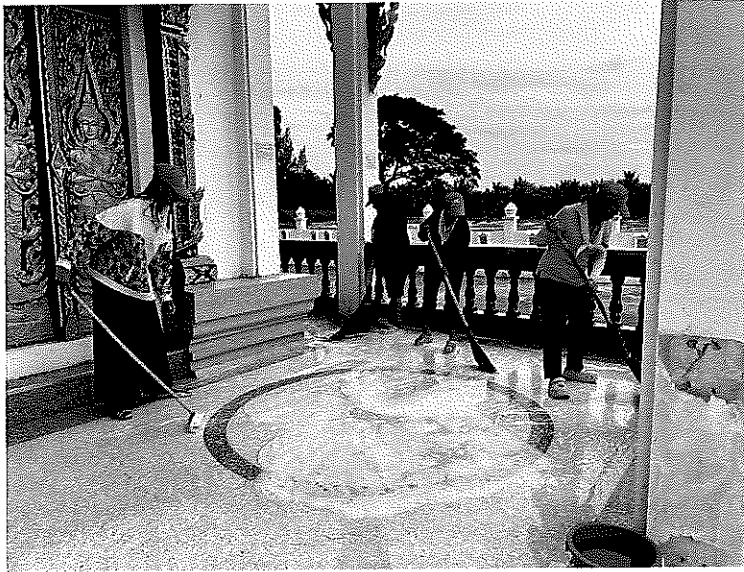

โครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาอาชีพ  
ประจำปีงบประมาณ 2568



โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
ประจำปีงบประมาณ 2568

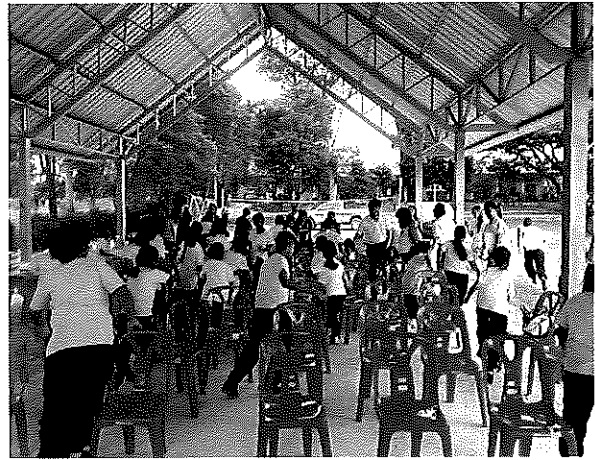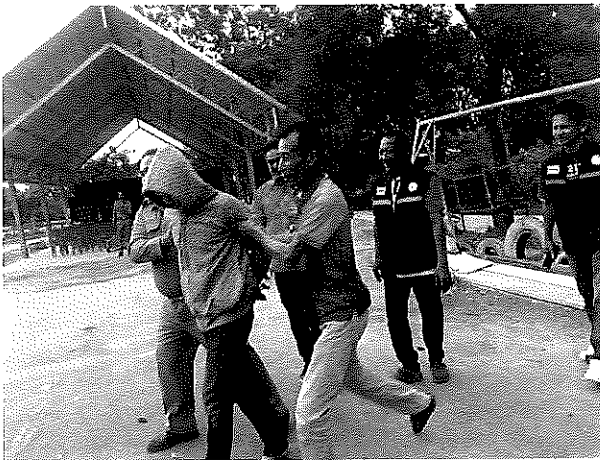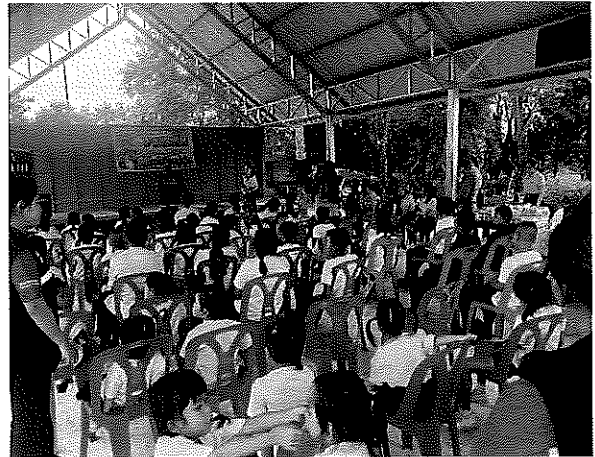


โครงการงานประเพณีลอยกระทง

ประจำปีงบประมาณ 2568





โครงการงานประเพณีแห่เครื่องสักการะหลวงพ่อในกุฎิ  
ประจำปีงบประมาณ 2568

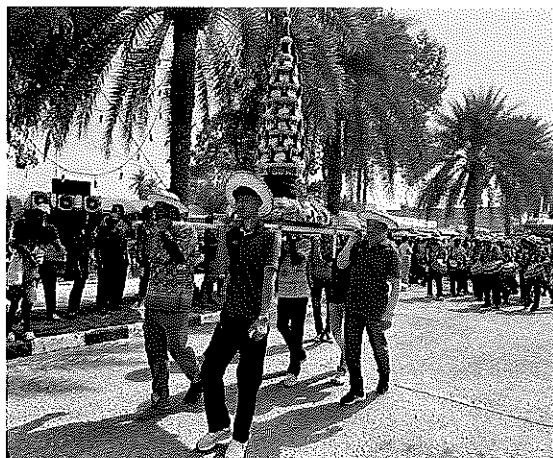

โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา

ประจำปีงบประมาณ 2568

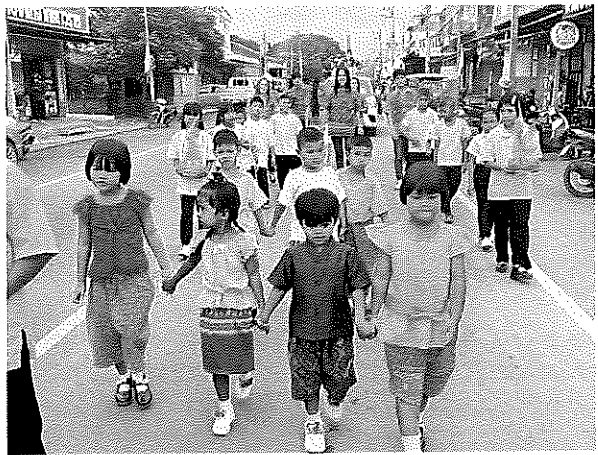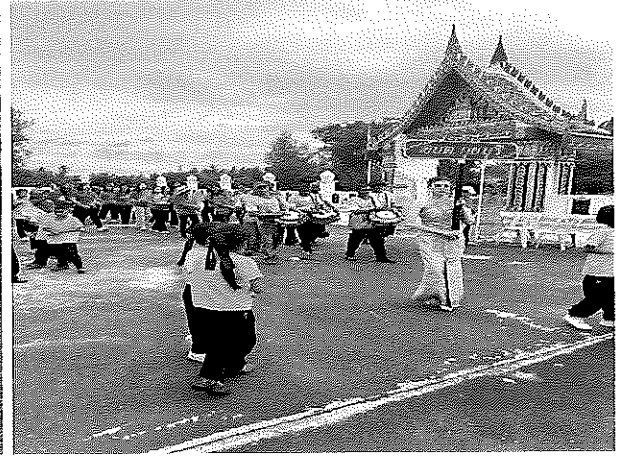



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุยบุรี  
เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

\*\*\*\*\*

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- (๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
- (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
- (๓) กำหนดให้รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปิดปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลกุยบุรี ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายงานติดตามและประเมินผลแผนฯ ดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายวินัย ไหล่ตัน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุยบุรี

